

云南省龙陵县筑巢行动项目 阶段行进展报告 (截至 2017 年 3 月 28 日)

一、项目背景

2015 年 12 月 30 日、2016 年 5 月 6 日，中兴通讯公益基金会先后向我会共捐赠 100 万元用于云南省两个筑巢行动项目。2016 年 1 月，中兴通讯公益基金会前往云南省龙陵县先后对镇中心小学、帮工小学、帕掌河小学、小米地小学进行项目调研。根据对调研结果进行综合分析，建议在帕掌河小学、小米地小学开展筑巢行动项目。



组图 1：象达乡帮工村小学宿舍现状



组图 2：老师和孩子们的宿舍楼



组图 3：象达乡小米地小学宿舍

二、项目进展

项目调研结束后，我会工作人员与地方教育局、老师保持沟通，对地方积极性、配合程度进行综合分析，并协助地方进行项目申报。2016 年 5 月，项目申报材料递交齐全，经审核，并报捐赠方审定，于 2016 年 5 月 11 日确定将项目点定在小米地小学和帕掌河小学。项目进入立项阶段，并于 7 月完成立项工作。

2016 年 8 月第一周，地勘单位对小米地小学、帕掌河小学进行地质勘探工作，8 月 26 日，地勘单位提交地勘报告。



图 1：小米地小学地勘现场




图 2：小米地小学现场岩心



图 3：帕掌河小学地质勘探现场照片



图 4：帕掌河小学地质勘探现场岩心样品

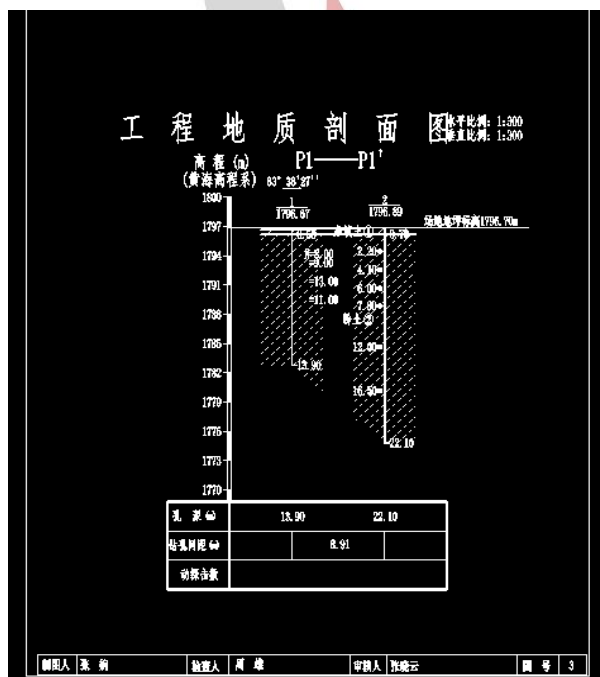

龙陵县象达镇小米地小学学生宿舍楼 场地岩土工程勘察报告 (详细勘察阶段)

云南省保山志良工程勘察有限公司

工程勘察资质证书编号: B253011092

联系电话: 0875-2203171 手机: 13908751507


二〇一六年八月二十一日

云南省工程勘察设计文件(出图)专用章		
单位名称: 云南省保山志良工程勘察有限公司		
有效期至: 2017年06月30日		
说明: 工程勘察专业类岩土工程乙级, 工程勘察专业类水文地质勘察乙级, 工程勘察专业类工程测量乙级, 工程勘察专业类工程地质, 工程勘察专业类工程勘察。		
编目出图章编号: 2201600012740 项目名称: 龙陵县象达镇小米地小学学生宿舍楼 用途: 详细勘察		

组图 1: 小米地小学地勘成果(部分)


龙陵县象达镇帕掌河小学学生宿舍楼
场地岩土工程勘察报告
(详细勘察阶段)

云南省保山志良工程勘察有限公司
工程勘察资质证书编号: B253011092
联系电话: 0875-2203171 手机: 13908751507
二〇一六年八月二十三日

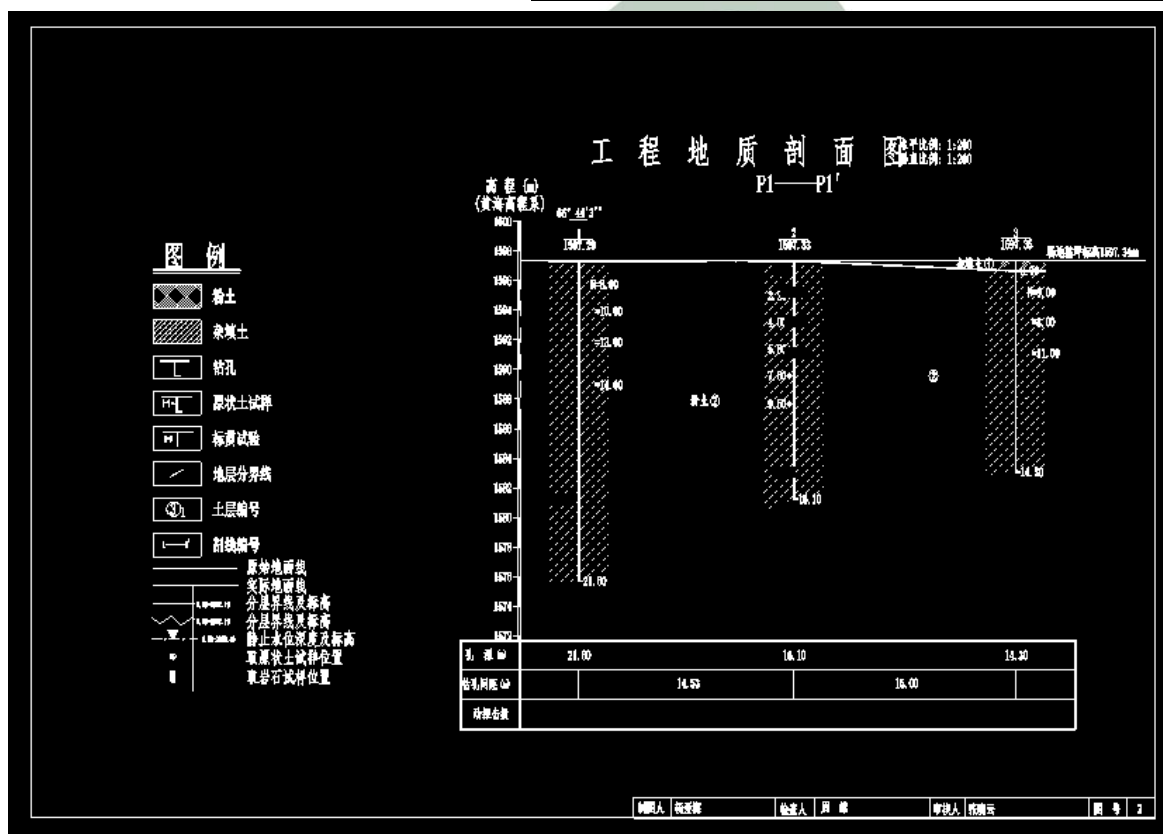

组图 2: 帕掌河小学地勘成果 (部分)

8月26日,地勘报告递交至设计公司,开始进行图纸设计。9月14日,设计图纸成型,在取得教育局和使用方确认后,图纸开始进入图审阶段。10月13日,图审公司出具审查合格书。

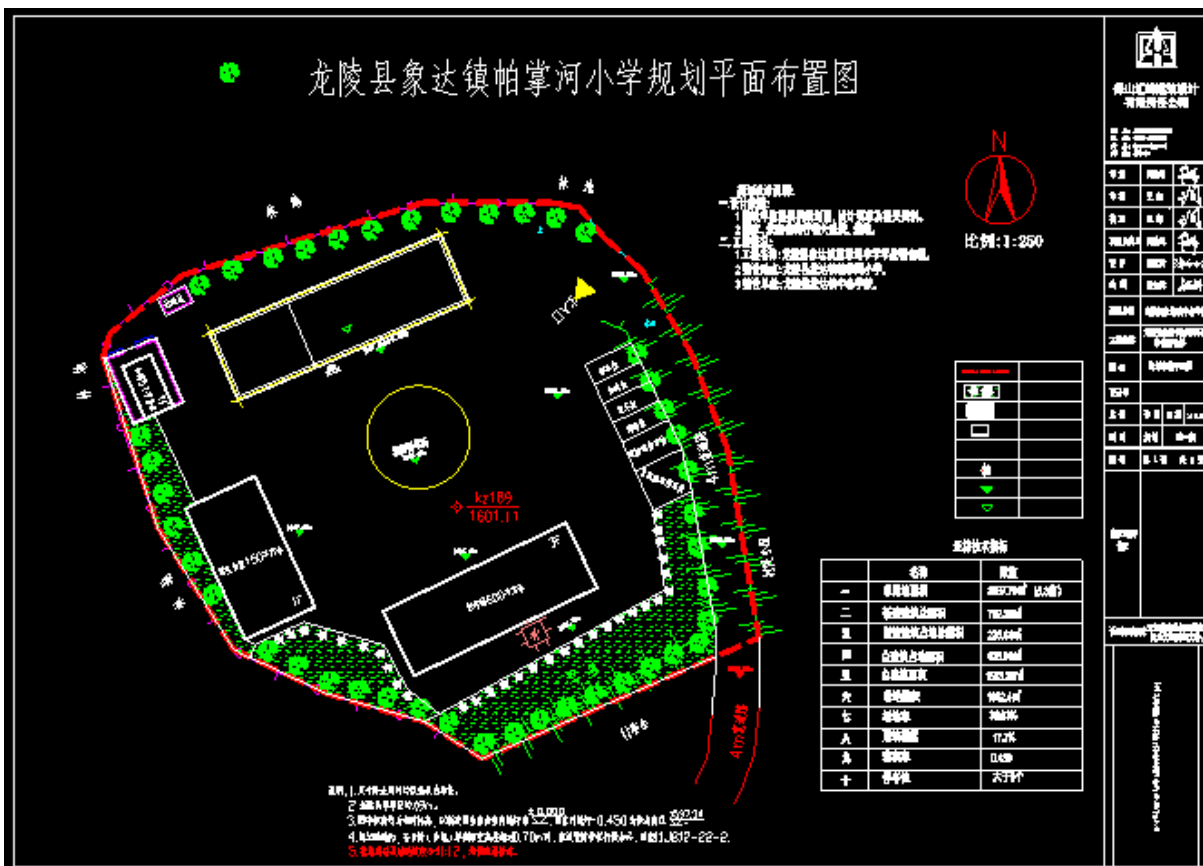

SGT 0000057

云南省建设工程施工图设计文件

审查合格书

保施设审 字（龙陵 16）第 041 号

根据中华人民共和国国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》等法律法规，该项目施工图设计文件经审查合格，准予使用。

建设工程施工图设计文件审查报告（保施审 HYL2016-041）及相关资料修改资料必须作为施工图设计文件的组成部分在工程建设中贯彻实施。

单位名称：保山市住房和城乡建设局	审查机构名称：保山市住房和城乡建设局
审查机构类别：二类	审查机构证书编号：S23102
勘察资质有效期：2016年12月31日	设计资质有效期：2016年12月31日
市政设计资质有效期：2016年12月31日	

审查机构签章

审查机构法定代表人签章

2016 年 9 月 29 日

保山市住房和城乡建设局印制

龙陵县象达镇小米地小学学生宿舍楼

建设项目名称：龙陵县

建设项目地址：房屋建筑

建设项目类别：房屋建筑

建筑项目等级：三级

建筑项目规模：建筑面积：869.41 m²

建设单位名称：龙陵县象达镇中心学校

勘察单位名称：云南省保山志良工程勘察有限公司

设计单位名称：保山汇峰建筑设计有限责任公司

审查机构各专业审查人员签章：

勘察：黄兴周 建筑：李武云 结构：蒙祖布

给排水：董滔 电气：朱学满

说明：

- 1、本合格书由审查机构对审查合格的建设工程施工图设计文件核发；
- 2、本合格书是基本建设程序的法定文书，不得涂改、伪造；
- 3、本合格书在工程竣工后作为工程档案归档；
- 4、本合格书由保山市住房和城乡建设局统一印制，任何人和机构不得翻印。

SGT 0000109

云南省建设工程施工图设计文件

审查合格书

保施设审 字（龙陵 16）第 045 号

根据中华人民共和国国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》等法律法规，该项目施工图设计文件经审查合格，准予使用。

建设工程施工图设计文件审查报告（保施审 HYL2016-045）及相关资料修改资料必须作为施工图设计文件的组成部分在工程建设中贯彻实施。

单位名称：保山市住房和城乡建设局	审查机构名称：保山市住房和城乡建设局
审查机构类别：二类	审查机构证书编号：S23102
勘察资质有效期：2016年12月31日	设计资质有效期：2016年12月31日
市政设计资质有效期：2016年12月31日	

审查机构签章

审查机构法定代表人签章

年 月 日

保山市住房和城乡建设局印制

龙陵县象达镇帕掌河小学学生宿舍楼

建设项目名称：龙陵县

建设项目地址：房屋建筑

建设项目类别：房屋建筑

建筑项目等级：三级

建筑项目规模：建筑面积：752.29 m²

建设单位名称：龙陵县象达镇中心学校

勘察单位名称：云南省保山志良工程勘察有限公司

设计单位名称：保山汇峰建筑设计有限责任公司

审查机构各专业审查人员签章：

勘察：黄兴周 建筑：李武云 结构：蒙祖布

给排水：董滔 电气：朱学满

说明：

- 1、本合格书由审查机构对审查合格的建设工程施工图设计文件核发；
- 2、本合格书是基本建设程序的法定文书，不得涂改、伪造；
- 3、本合格书在工程竣工后作为工程档案归档；
- 4、本合格书由保山市住房和城乡建设局统一印制，任何人和机构不得翻印。

组图 5：小米地小学（上）、帕掌河小学（下）图纸审查合格书

2016 年 12 月 12 日，中兴·筑巢行动项目奠基仪式在龙陵县象达乡小米地小学举行，小米地小学宿舍楼正式开工建设。



组图 6：小米地小学基础地圈梁混凝土浇筑完成

由于春节放假及雨水天气影响，1 月-2 月进度较慢，截至 2017 年 3 月 28 日，小米地小学二层封顶（共 3 层），开始三层墙体砌筑。



组图 7：2 月底，小米地小学二层屋面钢筋绑扎完成



组图 8：3 月底，小米地小学二层屋面浇筑完成，三层墙体建设中

3月7日，帕掌河小学招标工作顺利完成，3月20日，帕掌河小学基础开挖，截至2017年3月28日，帕掌河小学基础开挖工作基本完成。



组图 9：3月20日，帕掌河小学基础开挖



组图 10：3月28日，帕掌河小学基础清理

三、项目困难

1、两所学校所处位置较为偏僻，交通条件较差，施工过程中材料运输容易受到天气、交通状况影响。

四、项目进度规划

- 1、加强与地方的沟通，确保项目能顺利开展。
- 2、督促小米地小学及帕掌河小学宿舍楼建设进度。
